

臺北市立中正高級中學 114年度校園修建工程說明

親師生一封信

114.4.11總務處

本校114年度校園修建工程施工已開始，去年部分工程因建管處開工申請延至開學後，以及緊急的耐震補強工程開始施作，可能略有不便，噪音、灰塵、工程圍籬、工程車輛進出也會干擾親、師、生作息，敬請見諒。

◆ 有幾件事情，開學後仍需要大家配合及幫忙：

- 一、「高水塔拆除工程」4/8開始給水線路佈線工項，請注意各樓棟給水管上頂樓之工區封鎖範圍。
- 二、「中正樓及美齡樓耐震補強工程」，預計5月13日開工，5月中後辦公室、專科教室及普通教室進行遷移，請注意5樓上樓之引導路線，以及勿進入工區封鎖範圍。

臺北市立中正高級中學114年度校園修建工程 工程概要

■114年度「高水塔拆除工程」

(一)各樓棟給水管線佈管、臨時給水區設置及新佈管線試水。

(二)高水塔2層以上建築體拆除、下水塔修復、下水塔給水接管、試水完工。

- 114年4月13日開始進場佈管，預計6月30日完工；預計工期：

臨時管線開挖與配置	臨時水塔配置	臨時水塔試運	舊有給水系統拆除	臨時供水系統防護	高水塔拆除	廢棄物清運	下水塔修復及清洗	竣工	驗收
4/8 - 4/25	4/26 - 4/30	5/1 - 5/10	5/11 - 5/20	5/21 - 5/29	5/30 - 6/1	6/1 - 6/5	6/5 - 6/20	6/21	6/30

■114年度「中正樓及美齡樓耐震補強工程」

(一)中正樓、美齡樓1-3搬遷、基礎工項(假設工程、走廊網路管線移位)。

(二)1-4擴柱工項(地板、柱體局部打除、植筋、封柱)，美齡樓1-3翼牆工項。

(三)柱(含仿石漆重漆)、牆、窗、門、櫃體、黑板(有翼牆工項的二側)，全部施作完成含表面粉刷。


(四)教室區及辦公室室內復原(側邊置物櫃、油漆、位置定位)。

- 預計114年5月6日(星期二)決標，113年8月20日竣工(100日曆天)，驗收完成9/15。

工程上網	工程簽約	備工備料	辦公室遷移、教室遷移	中正美齡3樓以下清空	中正美齡樓1-3樓動工	中正美齡樓全清空	中正美齡3-5部分竣工	中正美齡3-5部分驗收	中正美齡1-2竣工(含辦公室遷回)	中正美齡3-5啟用	中正美齡1-2部分驗收	中正美齡全部複驗完成	中正美齡全部恢復使用
4/22	5/6	5/13	5/24-6/2	6/3	6/3	6/30	8/15	8/20	8/20	8/25	8/25	9/12	9/15

■114年度「中美西廁所整修工程」尚待國教署複審中。

【附件1】學校平面圖工區標示

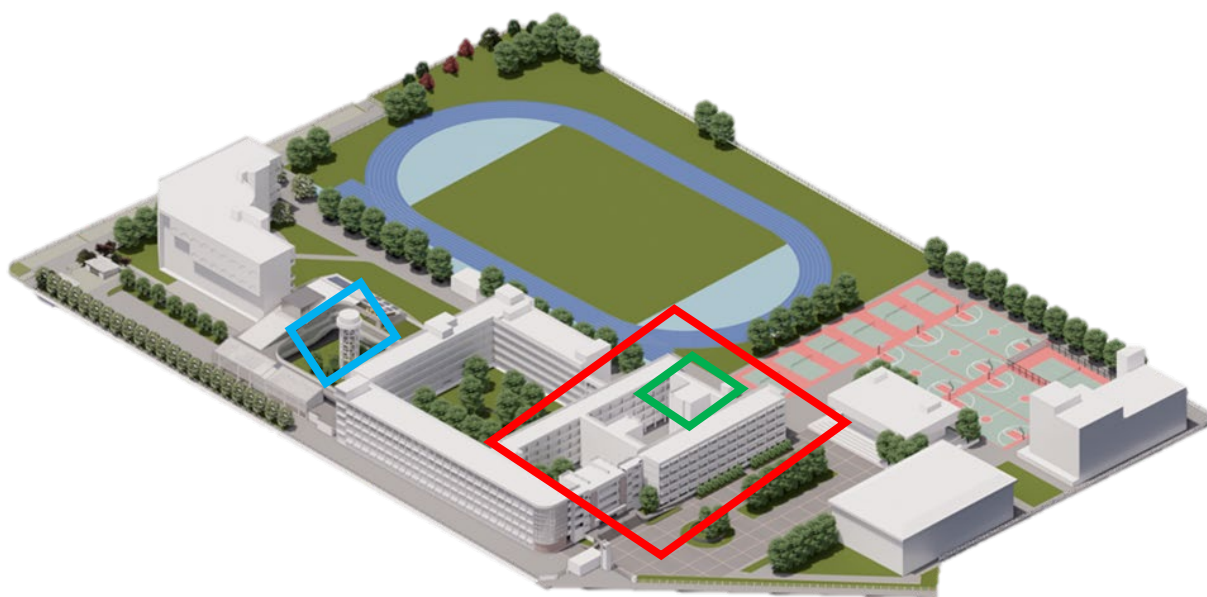

:「高水塔拆除工程」，預計6月30日完工。



:「中正樓及美齡樓耐震補強工程」預計9月15日完工。



:「中美西廁所整修工程」尚待國教署複審中。

【附件2】工區工程車輛進出動線

